

平成 27 年 K C 冬支度作業内容

青景

1. 雪囲いの設置

今年の 1 月に、K C 改築後 20 年以上使用してきた南側の雪囲いが、屋根からの大量の落雪で骨組みもろとも折れて使用できなくなりました。原因は想定外の厚さに積もった屋根の雪が一気に落下したことによるもので、そのショックで台所の窓ガラスにもひび割れが発生し、換気扇のフードカバーも壊れてしまいました。そこで、今回は石田さんの指導のもと新規の雪囲いを設置することにしました。完成した状況は写真に示すとおりです。従来庭側に組立設置してきた雪囲いは縮小して、外階段の下に収納しているガスボンベの部分のみとし、積雪期にガスボンベの搬入搬出がきるようにスペースを確保しました。したがって、それ以外の部分は落雪で埋まり、結果的に地下室のドアは使用できなくなります。ベランダの部分には、庭側の柱に L 型の金具を取り付けて、それに板を水平に差し込んで固定しています。柱が雪荷重で悪影響を受けないように、水平材で補強しています。従来よりも組立設置作業が楽になり、すっきりした外観となりました。また、北側の台所と洗面所の窓ガラスの部分も雪囲いで保護し、ひび割れた窓ガラスと換気扇のフードカバーも交換しました。

2. 栗の木の枝払い

玄関脇の栗の木が大きく成長して、枝の一部が屋根にかかっている。この影響で屋根に大量の雪が積もった可能性があるため、屋根にかかる枝を伐採した。ロープを使った高所作業で電気の引込線を切断しないように注意して行った。

3. 薪運び

五月から庭で乾燥させていた薪を地下室に搬入した。

4. 庭の整理（整地予定）

来年の 5 月連休に、前の庭を水平に整地することが決まったので、庭においていた木片を片付け、薪割りしてベランダ下に収納した。

5. 除雪用赤旗の取り付け

除雪車が走行する際の道路境界の目印に赤綿を取り付けた。

6. 排水枡の清掃

冬季には雪に埋まる台所の排水枡を清掃しました。

7. ツリーハウス手すり木

建設中のツリーハウスに使用する手摺り木を 100 本採取しました。

以上


冬支度作業写真



雪囲いの組立状況




完成した新規雪囲い

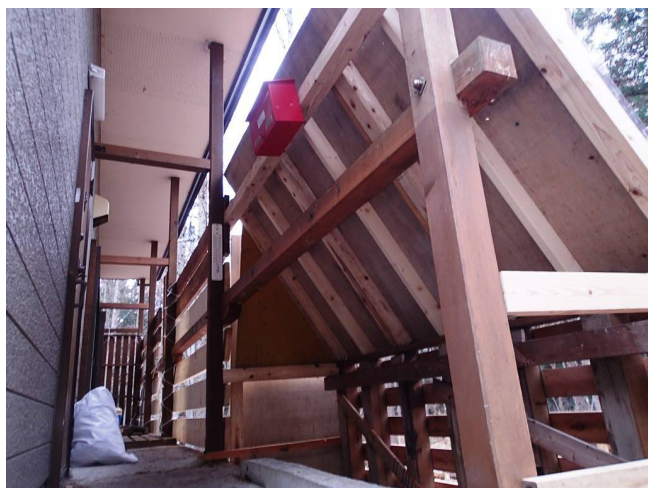

玄関付近の雪囲い



玄関側の雪囲い断面

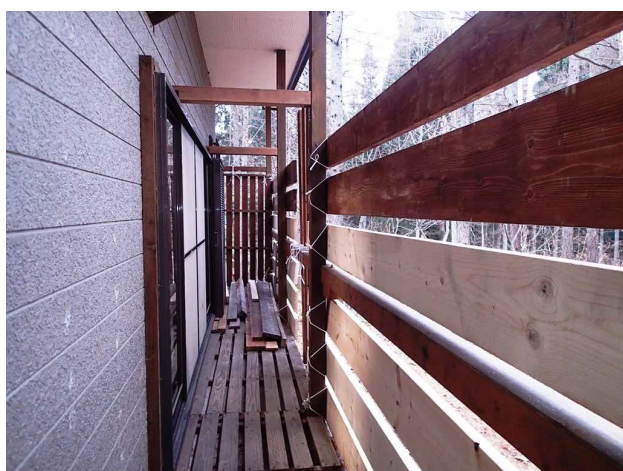

雪囲いの内部



台所と洗面所の窓枠の雪囲い設置



換気扇フードカバーの交換



屋根にかかる栗の木の枝を伐採



除雪境界に赤旗の設置



台所の排水柵の清掃



建設中のツリーハウス



ツリーハウス用の手摺り子の採取
